

5.2.1. Sprint 1

El Sprint 1 corresponde a la línea base AV1. El objetivo fue establecer la estructura Docs-as-Code del informe, documentar los primeros artefactos de discovery y diseño, y publicar la Landing Page como primer incremento visible del producto. La evidencia se organiza en planificación, backlog, commits, ejecución, despliegue y colaboración.

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

La planificación del Sprint 1 organizó la base documental, visual y pública del proyecto. El alcance del sprint se concentró en Landing Page, reporte Docs-as-Code, Product Backlog inicial, User Stories, discovery y artefactos de diseño.

Campo	Registro
Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	Primer incremento del proyecto orientado a establecer la base Docs-as-Code, el discovery inicial, los primeros artefactos UX/UI y la Landing Page pública.
Date	2026-04-01
Time	19:00 PM
Location	Reunión virtual del equipo
Prepared By	Yucra Sandoval, Diego Sebastian
Attendees (to planning meeting)	Yucra Sandoval, Diego Sebastian / Verde Bueno, Joaquín / Marín Cueva, César / Rojas Mancilla, Gerard / Torrejón, Gino
Sprint 0 Review Summary	No aplica por ser el primer sprint del proyecto.
Sprint 0 Retrospective Summary	No aplica por ser el primer sprint del proyecto.
Sprint Goal & User Stories	Landing Page, estructura Docs-as-Code, artefactos iniciales de discovery y diseño.
Sprint 1 Goal	Establecer la base documental y visual del proyecto mediante el reporte Docs-as-Code, la Landing Page y los primeros artefactos de investigación y diseño.
Sprint 1 Velocity	99 Story Points
Sum of Story Points	99 Story Points



Figura. Reunión virtual del equipo para coordinación de Sprint 1.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

La ejecución del sprint evidencia una distribución funcional del liderazgo. En lugar de concentrar toda la iteración en un único perfil, el equipo repartió la responsabilidad entre dominio, diseño, arquitectura, documentación y construcción visible del sitio. Esta organización es consistente con el Student Outcome ABET 5 y explica por qué el incremento AV1 combina trabajo público demostrable con profundidad ingenieril.

Distribución de liderazgos y roles funcionales en el Sprint 1

Team Member	GitHub Username	Project Management	UX/UI Design	Software Architecture	Frontend Development	Documentation
Yucra Sandoval, Diego Sebastian	DiegoS284	L	C	C	C	C
Verde Bueno, Joaquín Francisco	JoaquinVerde115	C	L	C	C	C
Marín Cueva, César Fernando	Cmarin2802	C	C	C	C	L
Torrejón De Los Santos, Gino Rodrigo	R0obxdnt-bit	C	C	C	C	L
Rojas Mancilla, Gerard Gianpier	GerardRojasMancilla	C	C	L	L	C

5.2.1.3. Sprint Backlog 1.

El Sprint Backlog 1 concentra el trabajo realizado entre el **2026-04-01 y 2026-04-23**. El objetivo principal del sprint fue construir la base documental del proyecto, organizar el trabajo bajo Docs-as-Code y consolidar el primer entregable visible mediante el Landing Page, junto con los artefactos iniciales de investigación, diseño y backlog.

Sprint 1 1 abr – 23 abr (31 actividades)		0 0 99		Completar sprint		...	
☒	NX-56	TS-NX-001-001	Setup Inicial del Entorno Docs-as-Code		FINALIZADO	3	
☒	NX-252	TS-NX-001-002	Redactar reporte de avance del Sprint 0 con métricas del equipo		FINALIZADO	8	
☒	NX-253	TS-NX-001-003	Crear y configurar repositorio en GitHub con estructura inicial		FINALIZADO	8	
☒	NX-389	TS-NX-001-004	Implementar estructura base de la landing page pública		FINALIZADO	5	
☒	NX-390	TS-NX-001-005	Documentar wireframes y mockups de landing page		FINALIZADO	3	
☒	NX-391	TS-NX-001-006	Consolidar entrevistas y artefactos de needfinding		FINALIZADO	8	
☒	NX-392	TS-NX-001-007	Modelar dominio inicial con EventStorming y C4		FINALIZADO	5	
☒	NX-393	TS-NX-001-008	Configurar estructura Docs-as-Code del reporte		FINALIZADO	3	
☒	NX-527	TS-NX-001-009	Documentar Style Guidelines y Arquitectura de la Información		FINALIZADO	3	
☒	NX-531	TS-NX-001-010	Documentar Lean UX Canvas y Assumptions		FINALIZADO	3	
☒	NX-536	TS-NX-001-011	Estructurar Product Backlog y User Stories		FINALIZADO	3	
☒	NX-540	TS-NX-001-012	Realizar Análisis de Competidores (Benchmarking)		FINALIZADO	3	
☒	NX-544	TS-NX-001-013	Desplegar Landing Page en Hosting Estático		FINALIZADO	8	
☐	NX-224	US01	Identificar el problema que atiende Nexa	EP01 — COMPRENSIÓ...	FINALIZADO	2	
☐	NX-225	US02	Reconocer el impacto de la información dispersa	EP01 — COMPRENSIÓ...	FINALIZADO	2	
☐	NX-226	US03	Recorrer información pública con continuidad	EP01 — COMPRENSIÓ...	FINALIZADO	2	
☐	NX-227	US04	Consultar la propuesta en el idioma preferido	EP01 — COMPRENSIÓ...	FINALIZADO	2	
☐	NX-228	US05	Distinguir alcance inicial y evolución futura	EP01 — COMPRENSIÓ...	FINALIZADO	2	
☐	NX-229	US06	Encontrar información complementaria de confianza	EP01 — COMPRENSIÓ...	FINALIZADO	1	
☐	NX-230	US07	Identificar valor para distribuidoras refrigeradas	EP02 — DESCUBRIMI...	FINALIZADO	2	
☐	NX-231	US08	Identificar valor para importadoras y mayoristas	EP02 — DESCUBRIMI...	FINALIZADO	2	
☐	NX-232	US09	Identificar valor para operadores de almacenamiento frío	EP02 — DESCUBRIMI...	FINALIZADO	2	
☐	NX-233	US10	Reconocer capacidades centrales antes del acceso	EP02 — DESCUBRIMI...	FINALIZADO	2	
☐	NX-234	US11	Resolver dudas frecuentes antes del contacto	EP02 — DESCUBRIMI...	FINALIZADO	2	
☐	NX-235	US12	Solicitar contacto comercial	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	3	
☐	NX-236	US13	Indicar contexto de empresa interesada	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	2	
☐	NX-237	US14	Compartir necesidad operativa principal	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	2	
☐	NX-238	US15	Evaluar acompañamiento para adopción inicial	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	2	
☐	NX-239	US16	Revisar tratamiento de datos de contacto	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	2	
☐	NX-240	US17	Consultar condiciones generales de uso	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	2	
☐	NX-241	US18	Diferenciar sitio público y aplicación operativa	EP03 — CONTACTO C...	FINALIZADO	2	
+ Crear							

URL del board/backlog: [Jira Backlog — Proyecto Nexa](#)

La siguiente tabla presenta los User Stories asignados al Sprint 1 y los Work-items utilizados para descomponer el trabajo. Además de las User Stories, el sprint incluye tareas de soporte documental, configuración y evidencia necesarias para completar el incremento comprometido.

Sprint #	User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	N/A	Setup inicial del entorno Docs-as-Code	NX-56	Preparar estructura base del reporte	Organizar la base documental en Markdown para registrar el avance	3.5	Diego Yucra	Done

Sprint #	User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
					del proyecto desde el primer sprint.		Sandoval	
Sprint 1	N/A	Redactar reporte de avance del Sprint 0 con métricas del equipo	NX-252	Documentar avance inicial del proyecto	Registrar el avance documental inicial y las primeras decisiones del equipo para sostener la trazabilidad del informe.	7.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	N/A	Crear y configurar repositorio en GitHub con estructura inicial	NX-253	Configurar repositorio del proyecto	Crear la base del repositorio y organizar la estructura inicial del trabajo colaborativo.	7.5	Gerard Rojas Mancilla	Done
Sprint 1	N/A	Implementar estructura base de landing page pública	NX-389	Construir base del Landing Page	Implementar la estructura inicial del sitio público para presentar la propuesta de valor del producto.	5.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	N/A	Documentar wireframes y mockups de landing page	NX-390	Registrar diseño visual del Landing Page	Documentar los wireframes y mockups del sitio público como evidencia de diseño UX/UI.	3.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	N/A	Consolidar entrevistas y artefactos de needfinding	NX-391	Organizar evidencia de investigación	Consolidar entrevistas, hallazgos y artefactos iniciales de análisis de usuarios.	7.5	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	N/A	Modelar dominio inicial con EventStorming y C4	NX-392	Documentar modelado inicial de dominio	Elaborar y registrar artefactos iniciales de dominio y arquitectura de alto nivel.	5.5	Gerard Rojas Mancilla	Done
Sprint 1	N/A	Configurar estructura Docs-as-Code del reporte	NX-393	Ordenar estructura documental del informe	Ajustar la organización del reporte para que siga la estructura solicitada en el statement.	3.5	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	N/A	Documentar Lean UX Canvas y Assumptions	NX-534	Completar artefactos Lean UX	Registrar assumptions, problem statements y canvas como soporte de discovery del proyecto.	3.5	Gino Torrejón	Done
Sprint 1	N/A	Estructurar Product Backlog y User Stories	NX-536	Organizar backlog inicial	Redactar y ordenar las User Stories y el Product Backlog inicial del producto.	4.0	César Marín	Done
Sprint 1	N/A	Realizar análisis de competidores	NX-540	Documentar benchmarking competitivo	Analizar competidores y registrar hallazgos para sustentar la diferenciación de Nexa.	3.5	Gerard Rojas Mancilla	Done
Sprint 1	US01	Identificar el problema que atiende Nexa	NX-224	Redactar contenido de problema principal	Presentar en el Landing Page el problema central que busca resolver Nexa.	2.0	Joaquín Verde	Done
Sprint 1	US02	Reconocer el impacto de la información dispersa	NX-225	Documentar impacto del problema	Explicar el impacto operativo de trabajar con información dispersa en pedidos y coordinación.	2.0	Gino Torrejón	Done
Sprint 1	US03	Recorrer información pública con continuidad	NX-226	Organizar recorrido del sitio público	Definir la continuidad de navegación del Landing Page para visitantes.	2.5	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	US04	Consultar la propuesta en el idioma preferido	NX-227	Registrar soporte de idioma	Documentar la intención de consulta multilinguaje en la propuesta pública.	2.0	Joaquín Verde	Done
Sprint 1	US05	Distinguir alcance inicial y evolución futura	NX-228	Explicar alcance inicial del producto	Diferenciar el alcance inicial del producto y su evolución esperada.	2.0	Joaquín Verde	Done
Sprint 1	US06	Encontrar información complementaria de confianza	NX-229	Organizar información de confianza	Presentar información complementaria que refuerce la credibilidad del Landing Page.	1.5	César Marín	Done
Sprint 1	US07	Identificar valor para distribuidoras refrigeradas	NX-230	Redactar propuesta para distribuidoras	Explicar el valor de Nexa para distribuidoras de productos refrigerados.	2.5	Gino Torrejón	Done
Sprint 1	US08	Identificar valor para importadoras y mayoristas	NX-231	Redactar propuesta para importadoras y mayoristas	Presentar el valor de Nexa para importadoras y mayoristas con operación B2B.	2.0	Diego Yucra Sandoval	Done

Sprint #	User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	US09	Identificar valor para operadores de almacenamiento frío	NX-232	Redactar propuesta para almacenamiento frío	Explicar el valor del producto para operadores vinculados a almacenamiento refrigerado.	2.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	US10	Reconocer capacidades centrales antes del acceso	NX-233	Documentar capacidades principales	Mostrar capacidades centrales del producto antes de ingresar a la aplicación operativa.	2.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	US11	Resolver dudas frecuentes antes del contacto	NX-234	Estructurar preguntas frecuentes	Organizar dudas frecuentes para reducir fricción antes del contacto comercial.	2.0	Gerard Rojas Mancilla	Done
Sprint 1	US12	Solicitar contacto comercial	NX-235	Implementar contacto comercial	Habilitar una ruta de contacto para visitantes interesados en la propuesta.	3.0	César Marín	Done
Sprint 1	US13	Indicar contexto de empresa interesada	NX-236	Capturar contexto de empresa	Permitir que el visitante indique información básica sobre su empresa.	2.0	César Marín	Done
Sprint 1	US14	Compartir necesidad operativa principal	NX-237	Registrar necesidad operativa	Permitir que el visitante comunique la principal necesidad operativa que desea resolver.	2.0	César Marín	Done
Sprint 1	US15	Evaluar acompañamiento para adopción inicial	NX-238	Explicar acompañamiento inicial	Mostrar el soporte de adopción inicial considerado para empresas interesadas.	2.5	César Marín	Done
Sprint 1	US16	Revisar tratamiento de datos de contacto	NX-239	Documentar tratamiento de datos	Presentar el tratamiento básico de datos de contacto del visitante.	2.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	US17	Consultar condiciones generales de uso	NX-240	Documentar condiciones generales	Presentar condiciones generales asociadas al uso de la experiencia pública.	2.0	Diego Yucra Sandoval	Done
Sprint 1	US18	Diferenciar sitio público y aplicación operativa	NX-241	Explicar relación Landing Page y Web Application	Diferenciar el sitio público informativo de la aplicación operativa interna.	2.5	Joaquín Verde	Done
Sprint 1	N/A	Desplegar Landing Page en hosting estático	NX-544	Publicar Landing Page	Desplegar el Landing Page para disponer de una evidencia pública del primer incremento.	7.0	Diego Yucra Sandoval	Done

Nota. Las estimaciones se registran en horas para el control del Sprint Backlog, mientras que la priorización general del Product Backlog se mantiene en Story Points. Elaboración propia.

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

La evidencia de desarrollo del Sprint 1 abarca cuatro repositorios activos dentro de la organización [upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD](#). El repositorio **nexa-report** concentra toda la documentación académica del proyecto, construida de forma incremental desde el 01/04/2026. El repositorio **nexa-website** contiene la implementación real del Landing Page desplegado en GitHub Pages. Los repositorios **nexa-platform** y **nexa-webapp** fueron inicializados durante el sprint como base para la siguiente iteración. A continuación se presenta la tabla de commits relacionados con el incremento del Sprint 1, organizados por repositorio.

Commits del repositorio *nexa-report*

- Complete commit history: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website/commits>
- Branches: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website/branches>
- Contributors/Insights: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website/graphs/contributors>
- Network graph: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website/network>
- Release/tag: <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website/releases/tag/v1.0.0-sprint-1>

La tabla incluye los 30 commits disponibles del historial reconstruido del Landing Page. Ver tabla completa independiente en [website-commit-evidence-full.md](#).

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	main	c20ffd0	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): publish documentation quality checks	Merge documentation quality checks into main after Sprint 1 release	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-2

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
					preparation. This keeps the published website repository aligned with the final reviewed source. Supports GitHub collaboration evidence for Sprint 1.		
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	main	c38c737	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): publish sprint 1 landing page	Merge the Sprint 1 landing page release branch into main. This keeps the published branch aligned with the reviewed public website increment. Supports AV1 deployment and GitFlow evidence.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-2
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	4d59a1b	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): prepare sprint 1 landing page release	Record the Sprint 1 landing page release state with public pages, design system, i18n, and repository documentation. This branch marks the AV1 public website checkpoint. Supports release evidence for Sprint 1 review.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-2
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	93a5033	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): integrate seo-accessibility	Merge feature/seo-accessibility into develop with a no-fast-forward integration commit. This preserves documentation quality evidence for Sprint 1 review. Supports GitFlow traceability for the public Nexa website.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-2
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	8270da3	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): align develop with sprint 1 release	Merge the published Sprint 1 release state back into develop. This keeps long-lived branches aligned for later website improvements. Supports GitFlow continuity after AV1.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-2

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/seo-accessibility	18a72f4	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	ci(lint): add repository documentation check	Add a GitHub workflow for documentation checks on repository changes. This creates visible collaboration evidence around quality control. Supports Sprint 1 GitHub evidence for the public website.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-2
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/seo-accessibility	a0c2bb3	GerardRojasMancilla <u202413142@upc.edu.pe>	chore(markdown): add documentation lint rules	Add Markdown lint configuration for consistent website repository documentation. This keeps README and supporting docs reviewable under a predictable style. Supports Docs-as-Code hygiene for Sprint 1.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-2
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	41aa923	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): integrate segments-and-benefits	Merge feature/segments-and-benefits into develop with a no-fast-forward integration commit. This preserves feature branch evidence for Sprint 1 review. Supports GitFlow traceability for the public Nexa website.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/segments-and-benefits	842399b	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	docs(deploy): add static website deployment notes	Document the GitHub Pages static deployment scope and repository limits. This separates public website deployment from later service integration. Supports Sprint 1 deployment evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/segments-and-benefits	1d397d0	GerardRojasMancilla <u202413142@upc.edu.pe>	docs(qa): add landing page review checklist	Document navigation, language, CTA, and scope checks for the public site. This gives the team a repeatable Sprint 1 validation checklist.	QA, estabilizacion y cierre de Sprint	2026-04-1

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
					Supports execution evidence for the landing page.		
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-foundation	61935fe	Cmarin2802 <cesarmarin2802@gmail.com>	docs(landing): describe segment value proposition	Document the public landing scope, target pages, and scope boundaries. This aligns the repository evidence with Sprint 1 public website objectives. Supports segment and benefits traceability for AV1.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	f3b532c	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): integrate hero-value-proposition	Merge feature/hero-value-proposition into develop with a no-fast-forward integration commit. This preserves the landing page feature branch evidence for Sprint 1 review. Supports GitFlow traceability for the public Nexa website.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/hero-value-proposition	3cb13b7	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	feat(motion): add lightweight section animations	Add lightweight entrance behavior for visible page sections. This improves perceived continuity without changing content scope. Supports Sprint 1 visual polish evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/hero-value-proposition	1ae2575	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	feat(interactions): add landing interaction layer	Add navigation, language selection, menu, and UI interaction behavior for the public site. This turns the static pages into a usable landing experience. Supports Sprint 1 execution evidence for visitor navigation.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/hero-value-proposition	3c8c43e	Cmarin2802 <cesarmarin2802@gmail.com>	feat(copy): add bilingual landing content	Add bilingual copy dictionaries for homepage, platform, company, FAQ,	Landing Page, comunicacion publica y	2026-04-1

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
					and segment pages. This lets the public site communicate the Nexa value proposition in Spanish and English. Supports Sprint 1 internationalization evidence.	evidencia Sprint 1	
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/hero-value-proposition	10b99e6	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	feat(assets): add warehouse hero visual	Add the hero background image used to communicate refrigerated operations. This grounds the public page in the actual cold-chain domain. Supports Sprint 1 visual evidence for the product context.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	da8ae67	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): integrate landing-design-system	Merge feature/landing-design-system into develop with a no-fast-forward integration commit. This preserves the landing page feature branch evidence for Sprint 1 review. Supports GitFlow traceability for the public Nexa website.	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-design-system	97fa9ff	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	style(css): assemble public stylesheet entrypoint	Add the main CSS entrypoint that composes tokens, layout, buttons, typography, patterns, and components. This makes page styling predictable through one linked stylesheet. Supports Sprint 1 maintainability evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-design-system	9b0c78d	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	style(components): add landing component system	Add component styles for hero, cards, sections, forms, footer, and content blocks. This gives the site a complete reusable component layer.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
					Supports Sprint 1 implementation evidence for the landing UI.		
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-design-system	0cbb04d	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	style(buttons): add CTA and navigation button styles	Add button styles for primary, secondary, and navigation actions. This makes calls to action consistent across homepage and detail pages. Supports Sprint 1 conversion path evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-design-system	4af8cb0	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	style(layout): add responsive layout utilities	Add layout containers, spacing helpers, grids, and responsive width rules. This gives the multipage site a stable responsive structure. Supports Sprint 1 device-readiness evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-design-system	b529224	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	style(typography): add landing typography rules	Add typography rules for headings, body copy, links, and text rhythm. This keeps the public site readable across content-heavy sections. Supports Sprint 1 UX/UI evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-design-system	4332257	JoaquinVerde115 <u20241a054@upc.edu.pe>	style(tokens): define Nexa visual tokens	Add color, spacing, radius, shadow, and surface tokens for the public website. This gives the landing page a consistent visual foundation. Supports Sprint 1 UI consistency evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	release/sprint-1-landing-page	9b2eab6	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(release): integrate landing-foundation	Merge feature/landing-foundation into develop with a no-fast-forward integration commit. This preserves the landing page feature branch evidence for Sprint 1 review. Supports GitFlow traceability for the	Cierre GitFlow y release TB1	2026-04-1

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-foundation	3167657	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	docs(requirements): add course requirement references	public Nexa website. Add the requirement reference PDFs used to align the repository with course delivery expectations. This keeps academic constraints near the public website source. Supports Sprint 1 documentation and review traceability.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-foundation	be60239	Cmarin2802 <cesarmarin2802@gmail.com>	feat(segments): add segment solution pages	Add solution pages for importers, distributors, and cold-storage operators. This maps the landing experience to the target market segments used in the report. Supports Sprint 1 segment-specific value proposition evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-foundation	34a610f	Cmarin2802 <cesarmarin2802@gmail.com>	feat(pages): add FAQ and solution index pages	Add FAQ and solution overview pages for common questions and segment discovery. This helps visitors understand scope before requesting contact. Supports Sprint 1 public content evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-foundation	10d645b	GerardRojasMancilla <u202413142@upc.edu.pe>	feat(pages): add platform and company pages	Add platform and company pages to separate product explanation from team and company context. This gives the public site a multipage information architecture. Supports Sprint 1 navigation and solution-profile evidence.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1

Repository	Branch	Commit Id	Author	Commit Message	Commit Message Body	Sprint Evidence Scope	Commit on
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	feature/landing-foundation	0a1c99c	GerardRojasMancilla <u202413142@upc.edu.pe>	feat(landing): add semantic homepage shell	Add the main landing page document with semantic sections for the public Nexa story. This establishes the homepage route used by visitors and reviewers. Supports Sprint 1 evidence for the public product increment.	Landing Page, comunicacion publica y evidencia Sprint 1	2026-04-1
upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD/nexa-website	main	ce49bb3	DiegoS284 <diego64g284@gmail.com>	chore(repo): establish website repository baseline	Add ignore rules and repository presentation for the public Nexa landing page. This gives the Sprint 1 website a clean source baseline before feature work. Supports the AV1 public-facing increment and GitHub collaboration evidence.	Evidencia de repositorio y trazabilidad de Sprint	2026-04-1.

Evidencia visual del repositorio nexa-website

 Historial de commits del repositorio nexa-website - Sprint 1

Figura. Historial de commits de nexa-website en GitHub sobre la rama develop.

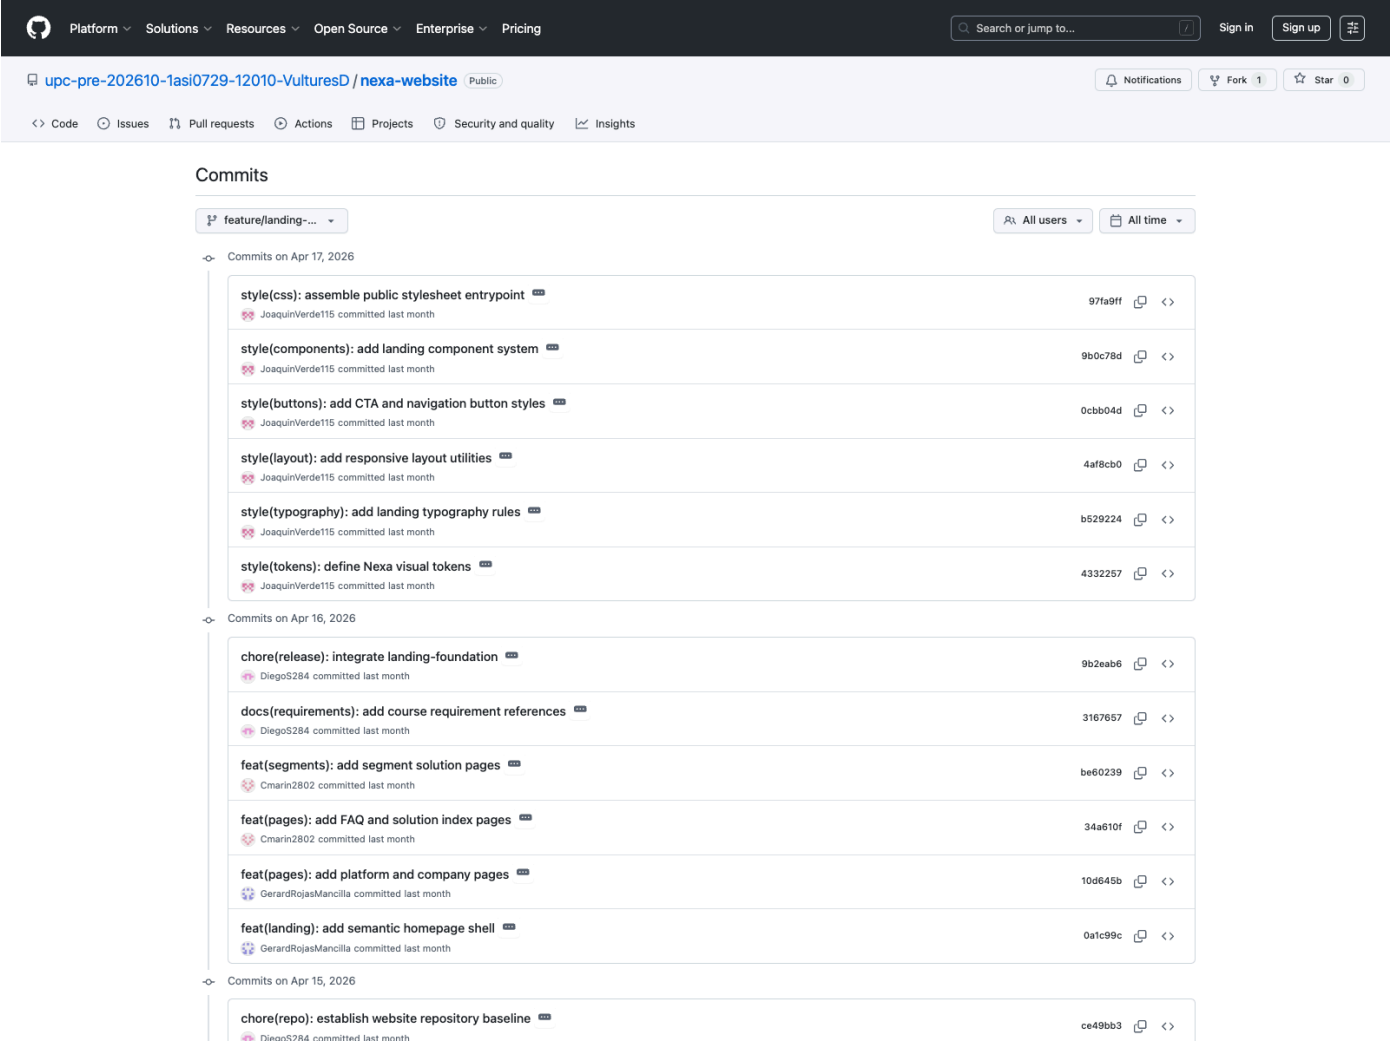


Figura. Historial de commits de la rama `feature/landing-design-system`.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search or jump to...

Sign inSign up

upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD / nexa-websitePublic

NotificationsFork 1Star 0

<> CodeIssuesPull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Branches

OverviewActiveStaleAll

Q Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind Ahead	Pull request
main	33 minutes ago		Default	
develop	33 minutes ago		0 0	
feature/hero-value-proposition	33 minutes ago		12 0	
feature/landing-design-system	33 minutes ago		17 0	
feature/landing-foundation	33 minutes ago		24 0	
feature/segments-and-benefits	33 minutes ago		8 0	
feature/seo-accessibility	33 minutes ago		2 0	
release/sprint-1-landing-page	33 minutes ago		6 0	

Figura. Ramas GitFlow conservadas en nexa-website para sustentar colaboracion y release.

The screenshot displays the GitHub repository page for `upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD / nexa-website`. The repository is public and has 8 branches and 1 tag. The main branch is selected. The repository description is "Landing page for Nexa B2B platform — HTML5 / CSS3 / Vanilla JS with custom i18n, deployed on GitHub Pages." The repository has 0 stars, 0 watching, and 1 fork. The repository is reported by DiegoS284.

The repository files list shows the following files and their commit history:

File	Commit Message	Commit Date
<code>.github/workflows</code>	ci(lint): add repository documentation check	3 weeks ago
<code>assets</code>	feat(motion): add lightweight section animations	last month
<code>docs</code>	chore(release): prepare sprint 1 landing page release	3 weeks ago
<code>pages</code>	feat(segments): add segment solution pages	last month
<code>.gitignore</code>	chore(repo): establish website repository baseline	last month
<code>.markdownlint.json</code>	chore(markdown): add documentation lint rules	3 weeks ago
<code>README.md</code>	chore(repo): establish website repository baseline	last month
<code>index.html</code>	feat(landing): add semantic homepage shell	last month
<code>nexa.svg</code>	chore(repo): establish website repository baseline	last month

The README rendering shows the Nexa logo and the title "Nexa — Landing Page". Below the title, it states "B2B web platform for refrigerated and frozen food distributors in Peru". The repository is built with HTML5, CSS3, and JavaScript. The repository is part of the course "IASI0729 Desarrollo de Aplicaciones Open Source" and is in the "In Development" status. The repository is maintained by Diego Y. Sandoval, JoaquinVB115, GerardRojasMancilla, and Cmarin2802.

The repository is built with the following technologies:

- HTML5: 57.9%
- CSS3: 38.5%
- JavaScript: 3.6%

Figura. README renderizado del repositorio `nexa-website`.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search or jump to... Sign in Sign up

upc-pre-202610-1asi0729-12010-VulturesD / nexa-website

Notifications Fork 1 Star 0

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Releases Tags

v1.0.0-sprint-1
c28ffda
Compare

v1.0.0-sprint-1

DiegoS2B4 tagged this 3 weeks ago

Sprint 1 public landing page release for Nexa.

Assets 2

Source code (zip)3 weeks ago

Source code (tar.gz)3 weeks ago

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Figura. Tag `v1.0.0-sprint-1` usado como evidencia de cierre del Landing Page.

15 / 17

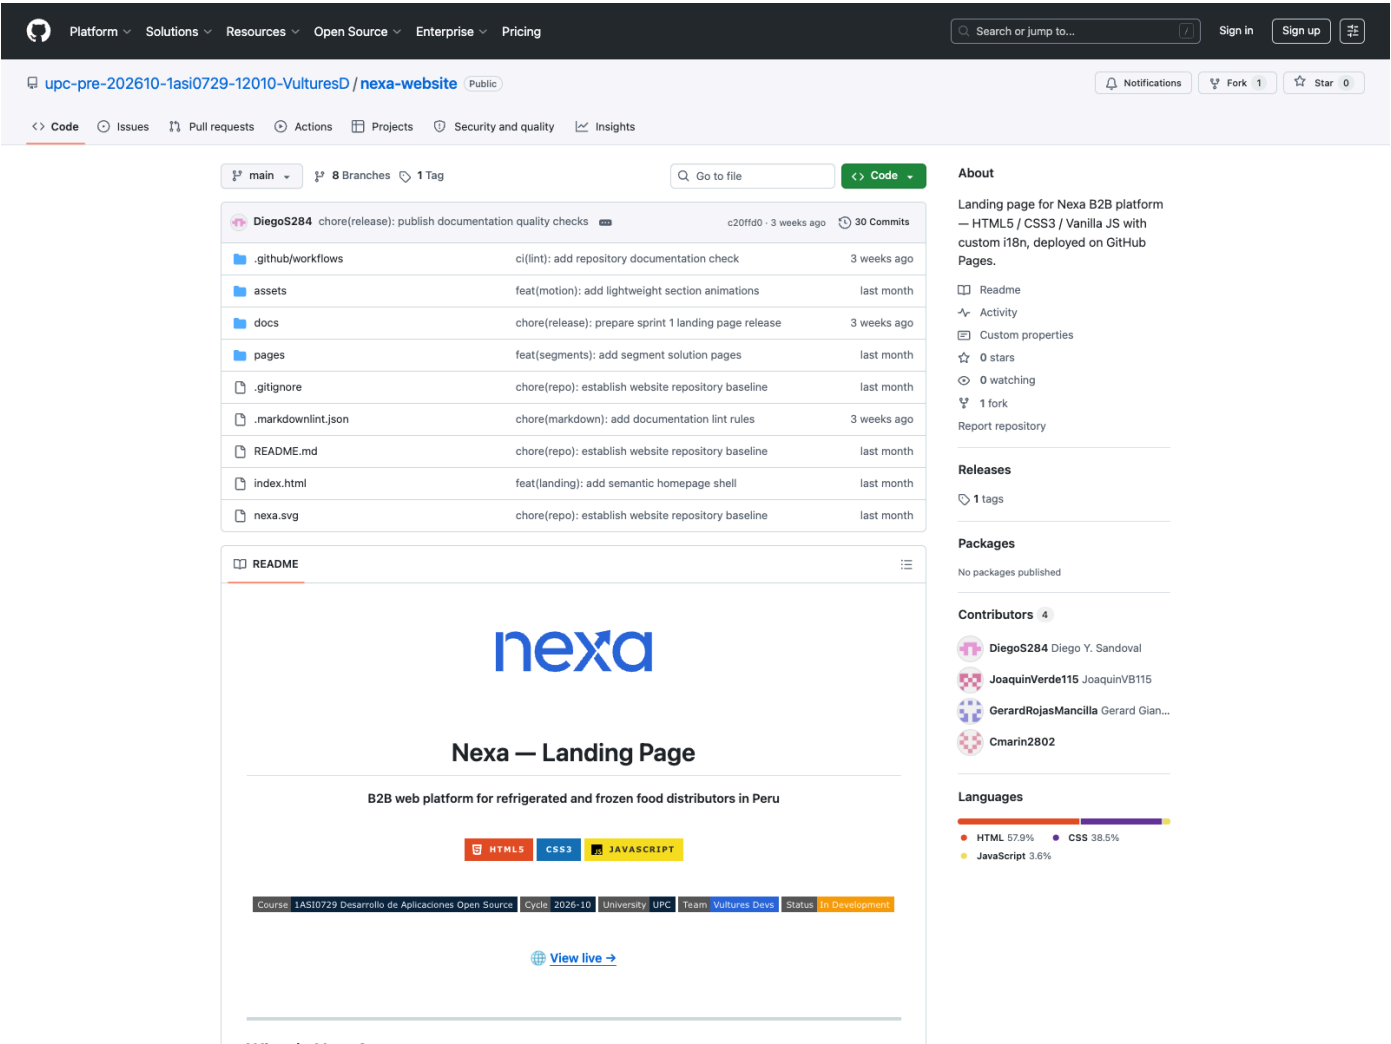


Figura. Vista general del repositorio `nexa-website` en GitHub.

Nota de captura: las vistas GitHub Insights Contributors y Network Graph no se incluyen como imagen porque quedaron en estado de carga durante la captura. Para evitar evidencia debil, se usan como evidencia primaria el historial de commits, ramas, release tag y README.

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

La ejecución visible del sprint ya se materializa en una landing page pública operativa con navegación multipágina, selector bilingüe, CTA de demostración, páginas por segmento y un relato claro sobre inventario, pedidos, temperatura y entrega. Esta salida confirma que el equipo sí llevó una parte del producto hasta una instancia de exposición real, lo que permite validación comercial y revisión técnica de consistencia entre lo prometido y lo implementado.

Ejecución observable del incremento Sprint 1

Elemento ejecutado	Evidencia observable	Estado
Home pública	<code>index.html</code> desplegado en GitHub Pages	Implementado
Página Platform	<code>pages/platform.html</code>	Implementado
Página Solutions y subpáginas por segmento	<code>pages/solutions/index.html</code> , <code>importers.html</code> , <code>distributors.html</code> , <code>cold-storage.html</code>	Implementado
Página Company	<code>pages/company.html</code>	Implementado
Página FAQ	<code>pages/faq.html</code>	Implementado
Sistema bilingüe	<code>assets/js/i18n.js</code> y selector EN/ES	Implementado
Interacciones del sitio	<code>assets/js/interactions.js</code> y <code>assets/js/animations.js</code>	Implementado
Portal B2B autenticado	Solo modelado en backlog y diseño	No forma parte de AV1
API y servicios REST	Solo modelados en backlog y arquitectura	No forma parte de AV1

Al mismo tiempo, la ejecución debe leerse con honestidad de alcance: el portal B2B autenticado, la captura transaccional de pedidos, el catálogo privado, la autenticación y el seguimiento operativo aún no forman parte del incremento entregado. Su presencia en backlog y en arquitectura demuestra preparación, pero no debe confundirse con ejecución completada dentro de AV1.

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

La documentación de servicios en AV1 existe principalmente como **evidencia de diseño y preparación técnica**. El backlog ya incorpora historias de API y documentación ([NX-138](#), además de las historias técnicas del bloque US58-US64), mientras que el capítulo 4 conserva la arquitectura DDD/C4, el diseño orientado a objetos y la base de datos que servirán de soporte a una fase posterior. Esta base es válida como sustento de ingeniería, porque muestra contratos previstos, separación de capas y reglas de negocio modeladas antes de implementar controladores productivos.

Evidencia disponible de documentación de servicios en AV1

Tipo de evidencia	Fuente	Alcance defendible
Historias técnicas de API	Capítulo 3 y backlog priorizado	Define necesidades y operaciones previstas
Diseño DDD y bounded contexts	Sección 4.6	Delimita responsabilidades del dominio
Diseño orientado a objetos	Sección 4.7	Anticipa entidades y relaciones del backend
Diseño de base de datos	Sección 4.8	Prepara persistencia para futuros servicios
Implementación ejecutable de servicios	No corresponde en esta entrega	Queda fuera del alcance observable de AV1

Por tanto, esta subsección debe defenderse como **documentación técnica preparada**, no como servicio implementado ni desplegado en producción. En AV1 basta con demostrar que el producto ya tiene una base de arquitectura y de contratos pensada para la siguiente fase, sin sobredeclarar software que todavía no corresponde a esta entrega.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

La evidencia de despliegue de AV1 sí existe, pero está concentrada en el frente público. La siguiente tabla separa lo que ya es demostrable de lo que todavía permanece en fase preparatoria.

Estado de despliegue y evidencia verificable de artefactos en AV1

Artefacto	Estado observable en AV1	Evidencia
Landing page pública	Desplegada y navegable	GitHub Pages
Repositorio documental	Versionado y colaborativo	nexa-report
Repositorio del sitio público	Implementación visible del frontend público	nexa-website
Web application autenticada	Fase posterior del producto	nexa-webapp . Nombrada en diseño y backlog, no como evidencia de despliegue AV1
Backend / servicios	Fase posterior del producto	nexa-platform . Nombrado en arquitectura y backlog, no como evidencia de despliegue AV1

Esta lectura permite defender el despliegue con precisión: Nexa ya tiene una capa pública activa y demostrable, pero la capa transaccional aún debe presentarse como roadmap técnico respaldado por backlog y arquitectura, no como despliegue concluido ni como parte del alcance observable de esta entrega.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

El Sprint 1 distribuyó responsabilidades entre investigación, UX/UI, implementación pública, arquitectura y documentación. Esta organización permitió avanzar en paralelo sin separar el reporte del software visible.

La principal conclusión colaborativa del sprint es que Nexa no se construyó como un esfuerzo fragmentado entre “los que escriben” y “los que programan”. El incremento visible solo fue posible porque Jira, el reporte, el diseño y la landing page evolucionaron de manera sincronizada. Aun cuando persista backlog remanente para portal B2B, autenticación, inventario transaccional y servicios, el equipo deja en AV1 una base metodológica sólida, trazable y escalable para la siguiente iteración.

Síntesis de colaboración del Sprint 1

Frente	Evidencia usada en el sprint	Resultado
Gestión y trazabilidad	Jira Software, commits en nexa-report y estructura Docs-as-Code	Backlog, capítulos y evidencias quedaron conectados al avance AV1
Diseño UX/UI	Wireframes, mockups y decisiones de navegación de Landing Page	La propuesta pública pudo explicarse con pantallas y recorrido de usuario
Implementación pública	Repositorio nexa-website y despliegue en GitHub Pages	Landing Page navegable para revisión académica
Coordinación del equipo	Sesión remota enlazada en Sprint Planning 1 y distribución LACX	Responsabilidades separadas por gestión, diseño, arquitectura, frontend y documentación

La evidencia visual del tablero se concentra en la captura principal de Sprint Backlog 1 incluida en §5.2.1.3. Las capturas antiguas del tablero y de commits no se duplican en esta subsección para mantener una sola lectura de evidencia por sprint.
